Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	Baugenehmigung	0 Tage	Do 15.09.11	Do 15.09.11	
2	Zuschussgenehmigung	0 Tage	Do 15.09.11	Do 15.09.11	
3					
4					
5	**VOB/A Ausschreibung Rohbau**	**51 Tage**	**Fr 09.09.11**	**Mi 23.11.11**	
11	Vergabe Rohbau	0 Tage	Fr 04.11.11	Fr 04.11.11	10EA-13 Tage
12					
13	**VOB/Aa Ausschreibung HLSE**	**83 Tage**	**Fr 28.10.11**	**Sa 25.02.12**	
17					
22					
23	**Rohbau**	**128 Tage**	**Mo 21.11.11**	**Do 24.05.12**	
24	**Hauptgebäude**	**118 Tage**	**Mo 21.11.11**	**Mi 09.05.12**	
25	Untergeschoss	43 Tage	Mo 21.11.11	Fr 20.01.12	11EA+11 Tage
26	Abbruch Bodenplatte	5 Tage	Mo 21.11.11	Fr 25.11.11	11EA+11 Tage
27	Grundleitungen	5 Tage	Mo 28.11.11	Fr 02.12.11	26
28	Fundamentverstärkungen	10 Tage	Mo 05.12.11	Fr 16.12.11	27
29	Unterfangungen	20 Tage	Mo 19.12.11	Di 17.01.12	28
30	Erdgeschoss	16 Tage	Di 10.01.12	Di 31.01.12	25EA-10 Tage
31	Dachöffnung herstellen	5 Tage	Do 01.03.12	Mi 07.03.12	
32	1. Obergeschoss	20 Tage	Do 02.02.12	Mi 29.02.12	30EA-5 Tage
33	2. Obergeschoss	27 Tage	Do 23.02.12	Fr 30.03.12	32EA-5 Tage
34	3.Obergeschoss	15 Tage	Mo 02.04.12	Di 24.04.12	33
35	**Rohbau fertig!**	**0 Tage**	**Di 24.04.12**	**Di 24.04.12**	**34**
36	CFK-Lamellen	10 Tage	Mi 25.04.12	Mi 09.05.12	35
37					
38	Verbau	5 Tage	Mi 25.04.12	Mi 02.05.12	34
39	Stützwand	15 Tage	Do 03.05.12	Do 24.05.12	38
40					
41	**Verwaltung / Treppe 1**	**40 Tage**	**Mi 18.01.12**	**Di 13.03.12**	
42	Fundamente	10 Tage	Mi 18.01.12	Di 31.01.12	29
43	Erdgeschoss	5 Tage	Mi 01.02.12	Di 07.02.12	42
44	1. Obergeschoss	10 Tage	Mi 08.02.12	Di 21.02.12	43
45	2. Obergeschoss	10 Tage	Mi 22.02.12	Di 06.03.12	44
46	3. Obergeschoss	5 Tage	Mi 07.03.12	Di 13.03.12	45
47					
48	**Nebenarbeiten**	**20 Tage**	**Mi 25.04.12**	**Do 24.05.12**	
49	Innenwände Küche	5 Tage	Mi 25.04.12	Mi 02.05.12	34
50	Nebengebäude	15 Tage	Do 03.05.12	Do 24.05.12	49
51					
52	**Stahlbau**	**10 Tage**	**Mi 18.04.12**	**Mi 02.05.12**	
55					
56	**Dach**	**35 Tage**	**Mi 25.04.12**	**Mo 18.06.12**	
60					
61	**Fenster**	**55 Tage**	**Mi 25.04.12**	**Mo 16.07.12**	
69					
70	**Rohinstalation**	**50 Tage**	**Mo 02.04.12**	**Mo 18.06.12**	
92					
93	**Innentüren+Verglasungen**	**15 Tage**	**Mo 04.06.12**	**Mo 25.06.12**	
97					
98	**Schlosser**	**70 Tage**	**Mo 02.04.12**	**Mo 16.07.12**	
102					
109	**Putzarbeiten**	**15 Tage**	**Fr 18.05.12**	**Mo 11.06.12**	
113					
114	**Estricharbeiten**	**25 Tage**	**Fr 25.05.12**	**Mo 02.07.12**	
120					
121	**Fliesenarbeiten**	**45 Tage**	**Di 19.06.12**	**Mo 20.08.12**	**119**
127					
128	**Endausbau**	**55 Tage**	**Di 26.06.12**	**Mo 10.09.12**	
136					
137	**Endmontage**	**20 Tage**	**Di 31.07.12**	**Mo 27.08.12**	
141					
142	Endreinigung	5 Tage	Di 28.08.12	Mo 03.09.12	129;130;138;139
143					
144	Einzug/Umzug	15 Tage	Di 14.08.12	Mo 03.09.12	131
145	Beginn Schulbetrieb	1 Tag	Do 13.09.12	Do 13.09.12	
146					
147	Außenanlagen	30 Tage	Mo 06.08.12	Fr 14.09.12	

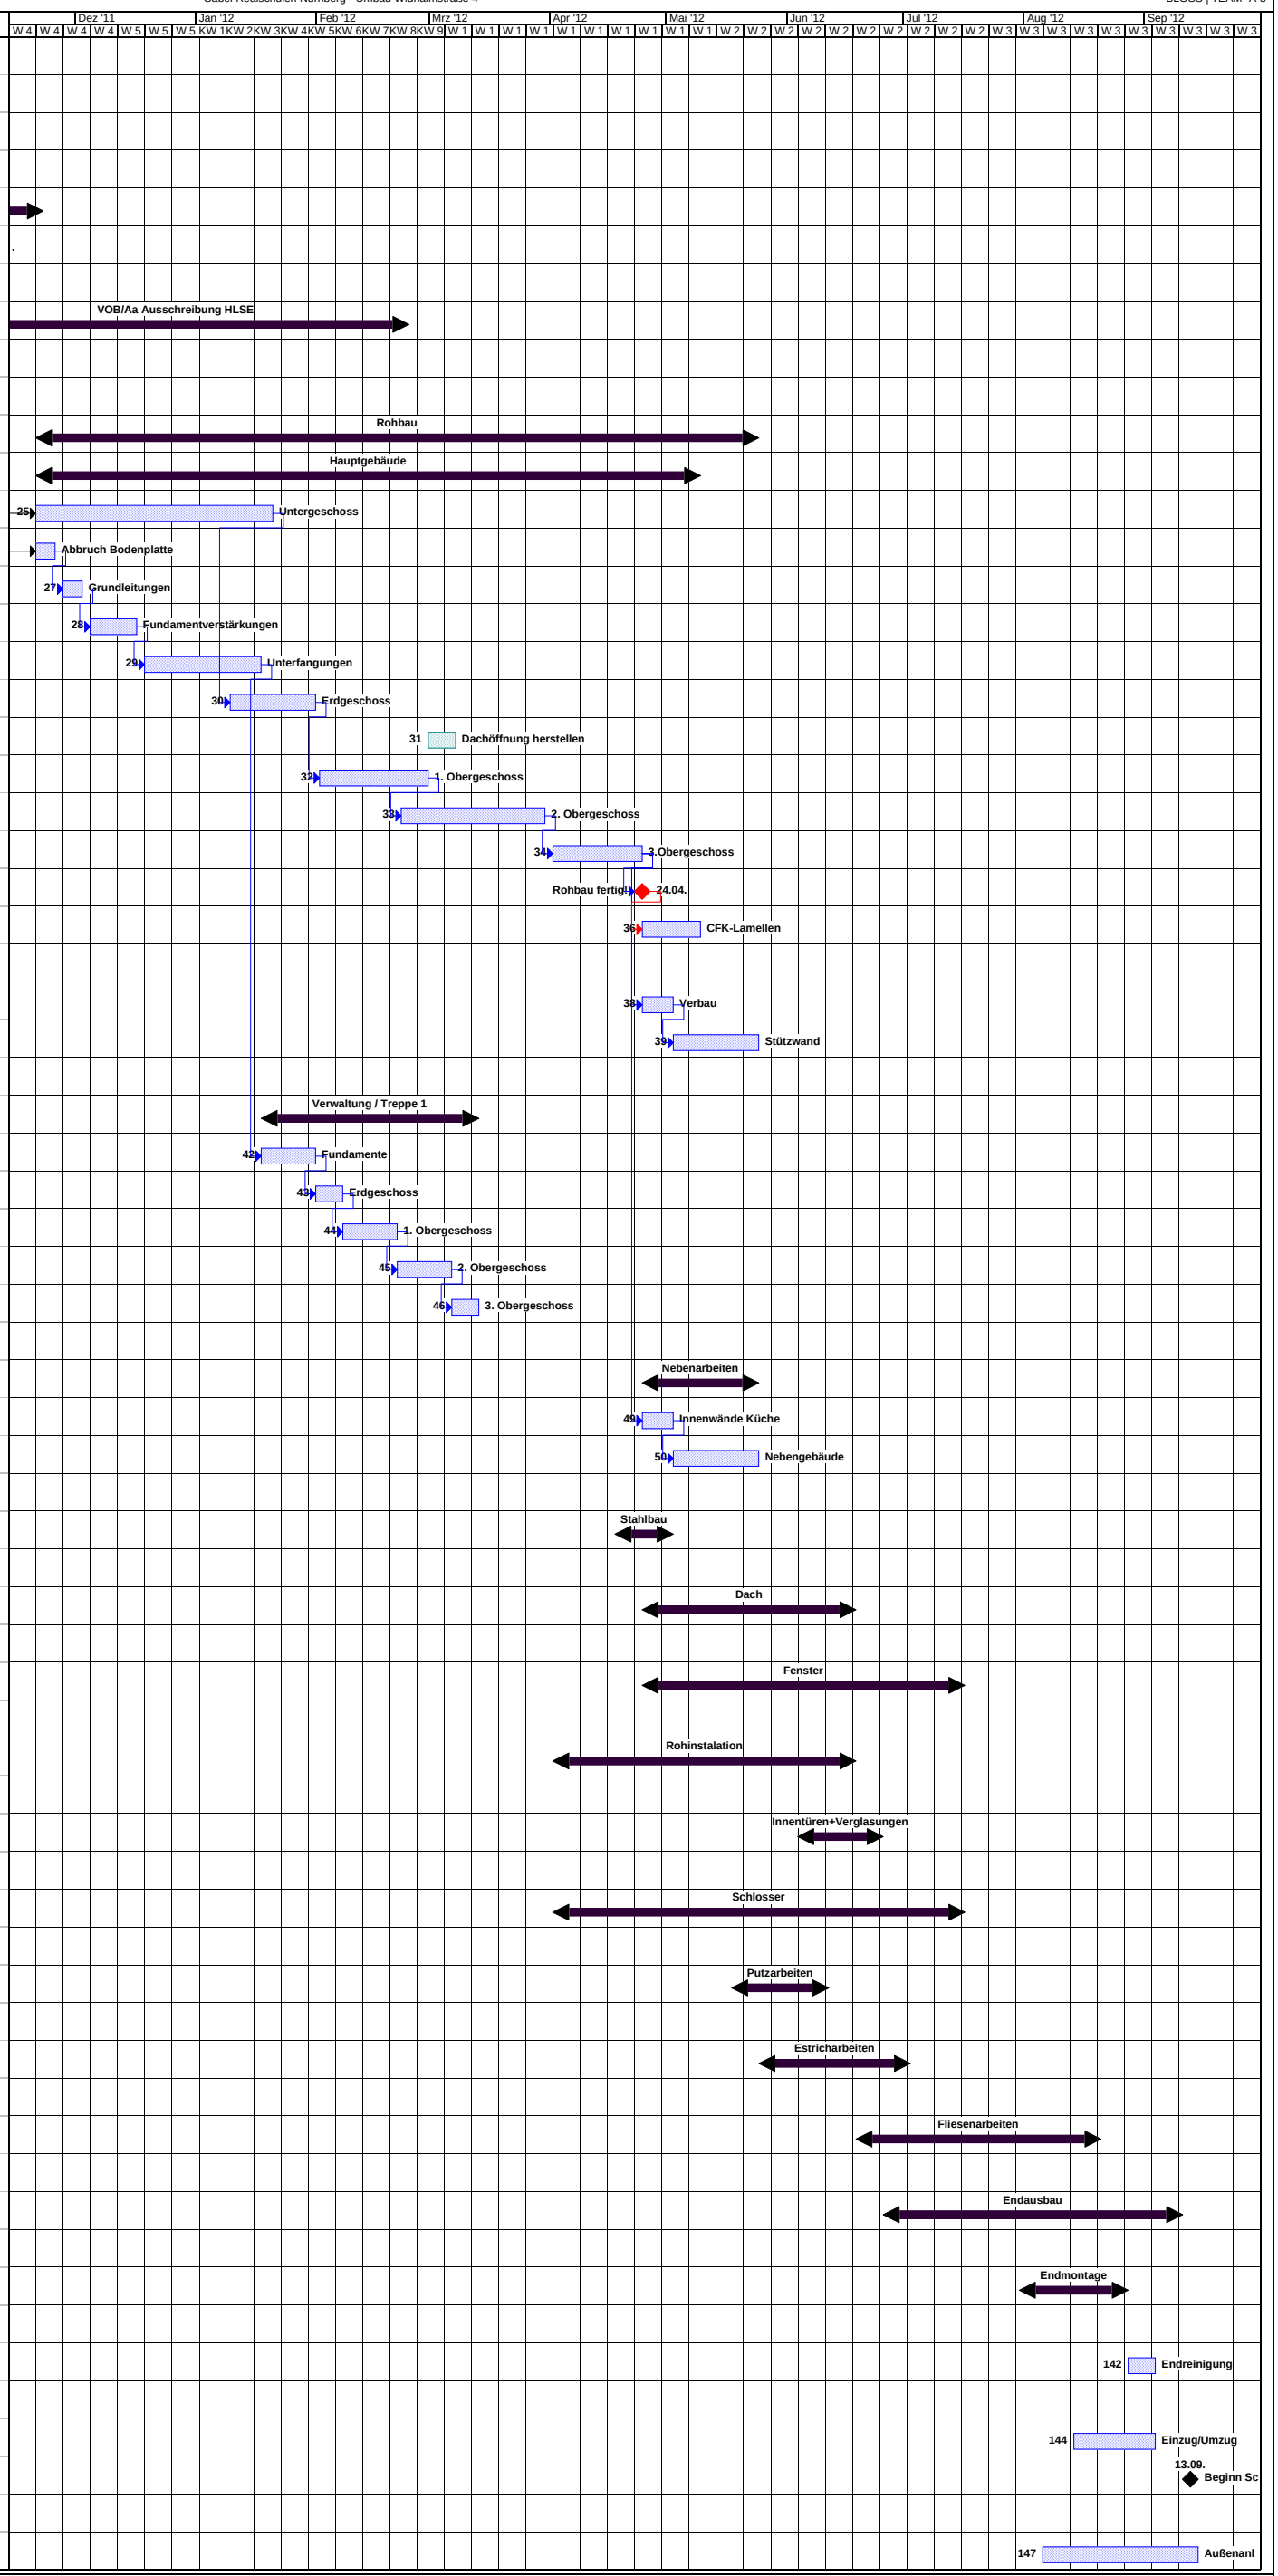

Projekt: \\TERASTATION\Projekte\090
Datum: Mo 12.09.11

Vorgang		Meilenstein		Rollup-Unterbrechung		Externe Vorgänge		Stichtag	
Unterbrechung		Sammelvorgang		Rollup-Meilenstein		Projekt-Sammelvorgang			
In Arbeit		Rollup-Vorgang		Rollup in Arbeit		Externer Meilenstein			
